

PROYECTO MINIFIT

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA



Integrantes: Dyland Martinez Cisternas
Polet Adasme Peñailillo
Fernanda Barra Reyes

Sección: Capstone-007v

Docente: Fernando Herrera Francesconi


ÍNDICE

- RIESGOS ANTERIORES
- PROGRESO ANTERIOR
- RIESGOS PRESENTADOS
- MITIGACION
- IMPACTO REAL
- PROXIMOS COMPROMISOS



RIESGOS MINIFIT

SPRINT 4 SEMANA 1

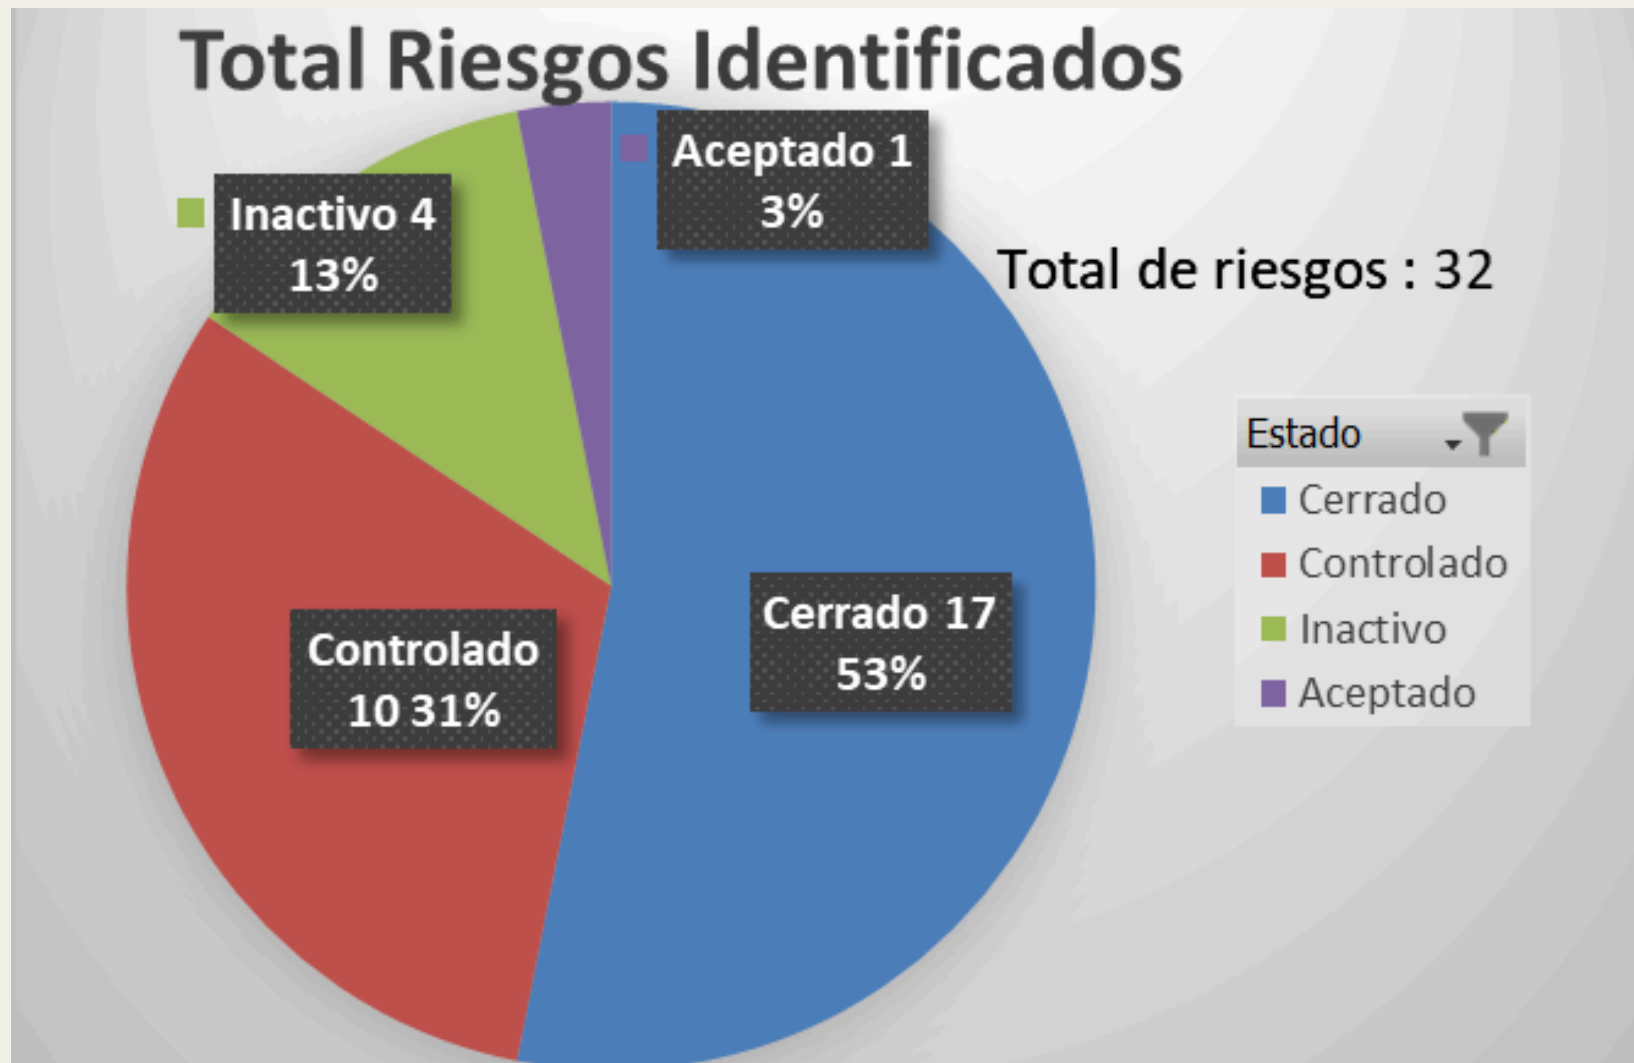

COMPROMISOS TOMADOS

SPRINT 4 SEMANA 1

SPRINT 4 SEMANA 2

<input type="checkbox"/>	Actividad	Prioridad	Estado	Start date	Fecha de ven... ↑
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-16 01-Crear proyecto en entorno de desarrollo...	Medium	FINALIZADO	09 oct 2025	10 oct 2025
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-17 02- Diseño de vistas de usuario	Medium	FINALIZADO	13 oct 2025	17 oct 2025
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-18 03- Integracion con API CRUD	Medium	CURSO	20 oct 2025	11 nov 2025
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-19 04- Pruebas y ajustes	Medium	NO INICIADO	11 nov 2025	12 nov 2025
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-87 Corrección de errores	Medium	CURSO	30 oct 2025	21 nov 2025
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-88 Corrección errores desarrollo MOBILE	Medium	FINALIZADO	27 oct 2025	04 nov 2025
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-24 QA y Ajustes ↗ +	Medium	CURSO	20 oct 2025	21 nov 2025
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-27 01-Diseño plan de pruebas MOBILE	Medium	FINALIZADO	20 oct 2025	21 oct 2025
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-28 02- Pruebas Funcionales MOBILE	Medium	FINALIZADO	22 oct 2025	29 oct 2025
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-83 05- Plan de pruebas WEB	Medium	FINALIZADO	03 nov 2025	04 nov 2025
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-84 06-Casos de pruebas funcionales WEB	Medium	CURSO	05 nov 2025	12 nov 2025
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-85 07-casos de integracion web	Medium	NO INICIADO	13 nov 2025	19 nov 2025
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-32 10- Validación Final MVP	Medium	NO INICIADO	20 nov 2025	21 nov 2025
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-29 03- Pruebas de Integración MOBILE	Medium	CURSO	29 oct 2025	21 nov 2025



RIESGOS PRESENTADOS

SPRINT 4 SEMANA 2



ID	Descripción	Tipo	Probabilidad	Valor de Probabilidad	impacto	Valor de Impacto	Magnitud (Pxl)	Responsable	Estado
R33	Retraso en la finalización del mantenedor web (último módulo pendiente)	Gestión	Media	2	Alta	3	6	Fernanda Barra (DEV)	Activo
R34	Errores menores de integración entre módulo web y API	Técnico	Baja	1	Alta	3	3	Fernanda Barra (DEV)	Activo
R35	Riesgo de sobrecarga de QA por validación simultánea Mobile/Web	QA	Media	2	Alta	3	6	Polet Adasme (QA)	Activo
R36	Falta de tiempo para revisión final de documentación técnica (ReadMe / Reportes)	Gestión	Media	2	Media	2	4	Dyland Martinez (PM)	Activo
R7	Incumplimiento de fechas de entrega en tareas individuales	Gestión	Media	2	Media	2	4	Dyland Martinez (PM)	Controlado
R15	Desalineación entre diseño prototipado (Figma / mockups) y el producto final	Gestión	Media	2	Media	2	4	Fernanda Barra (DEV)	Controlado
R17	Pérdida o corrupción de archivos del proyecto (repositorio, BD, etc.)	Técnico	Media	2	Alta	3	6	Fernanda Barra (DEV)	Controlado
R19	No cumplir con todos los entregables documentales exigidos (PPT, informe, anexos)	Gestión	Media	2	Alta	3	6	Dyland Martinez (PM)	Controlado
R27	Riesgo de duplicar esfuerzo QA al revalidar módulos corregidos	Gestión	Media	2	Media	2	4	Dyland Martinez (PM)	Controlado

Se activan nuevos riesgos

Se mantiene el seguimiento semanal

			Impacto		
			Bajo	Medio	Alto
			1	2	3
Probabilidad	Baja	1	1	2	3
	Media	2	2	4	6
	Alta	3	3	6	9

PLAN DE MITIGACION

SPRINT 4 SEMANA 2





ID	Descripción	Tipo	Probabilidad	Valor de Probabilidad	Impacto	Valor de Impacto	Magnitud (PxI)	Responsable	Plan de mitigacion	Estado
R33	Retraso en la finalización del mantenedor web (último módulo pendiente)	Gestión	Media	2	Alta	3	6	Fernanda Barra (DEV)	Se prioriza el desarrollo del mantenedor y se reducen tareas no críticas. QA Web revisa en paralelo el resto de vistas	Activo
R34	Errores menores de integración entre módulo web y API	Técnico	Baja	1	Alta	3	3	Fernanda Barra (DEV)	QA realiza pruebas de regresión rápidas al conectar mantenedor con API.	Activo
R35	Riesgo de sobrecarga de QA por validación simultánea Mobile/Web	QA	Media	2	Alta	3	6	Polet Adasme (QA)	Se redistribuyen casos de prueba entre QA Mobile y QA Web. Se asigna PM para apoyo en pruebas	Activo
R36	Falta de tiempo para revisión final de documentación técnica (ReadMe / Reportes)	Gestión	Media	2	Media	2	4	Dyland Martinez (PM)	Se Asigna tiempo en paralelo despues de las pruebas para actualizacion de documentacion	Activo

ACTUALIZACION DE RIESGOS

SPRINT 4 SEMANA 2

ID	Descripción	Tipo	Probabilidad	Valor de Probabilidad	Impacto	Valor de Impacto	Magnitud (P x I)	Responsable	Plan de mitigación	Estado
R33	Retraso en la finalización del mantenedor web (último módulo pendiente)	Gestión	Media	2	Alta	3	6	Fernanda Barra (DEV)	Se prioriza el desarrollo del mantenedor y se reducen tareas no críticas. QA Web revisa en paralelo el resto de vistas	cerrado
R34	Errores menores de integración entre módulo web y API	Técnico	Baja	1	Alta	3	3	Fernanda Barra (DEV)	QA realiza pruebas de regresión rápidas al conectar mantenedor con API.	cerrado
R35	Riesgo de sobrecarga de QA por validación simultánea Mobile/Web	QA	Media	2	Alta	3	6	Polet Adasme (QA)	Se redistribuyen casos de prueba entre QA Mobile y QA Web. Se asigna PM para apoyo en pruebas	cerrado
R36	Falta de tiempo para revisión final de documentación técnica (ReadMe / Reportes)	Gestión	Media	2	Media	2	4	Dyland Martinez (PM)	Se Asigna tiempo en paralelo despues de las pruebas para actualizacion de documentacion	Controlado
R7	Incumplimiento de fechas de entrega en tareas individuales	Gestión	Media	2	Media	2	4	Dyland Martinez (PM)	Reuniones diarias y registro de acuerdos, entrega de minutas y compromisos	Controlado
R15	Desalineación entre diseño prototipado (Figma / mockups) y el producto final	Gestión	Media	2	Media	2	4	Fernanda Barra (DEV)	Se realiza feedBack de avance con mockups definido en el proyecto entre el desarrollador y el equipo	Controlado
R17	Pérdida o corrupción de archivos del proyecto (repositorio, BD, etc.)	Técnico	Media	2	Alta	3	6	Fernanda Barra (DEV)	Se sube los avances del desarrollo dentro de GITHUB para tener respaldo de informacion y avances	Controlado
R19	No cumplir con todos los entregables documentales exigidos (PPT, informe, anexos)	Gestión	Media	2	Alta	3	6	Dyland Martinez (PM)	Se realiza reuniones diarias y se planifica presentacion final dias antes de la clase	Controlado
R27	Riesgo de duplicar esfuerzo QA al revalidar módulos corregidos	Gestión	Media	2	Media	2	4	Dyland Martinez (PM)	Se realiza un pre QA en la etapa de desarrollo para evitar nuevos defectos invalidantes	Controlado

ANTES Y DESPUES DE RIESGOS

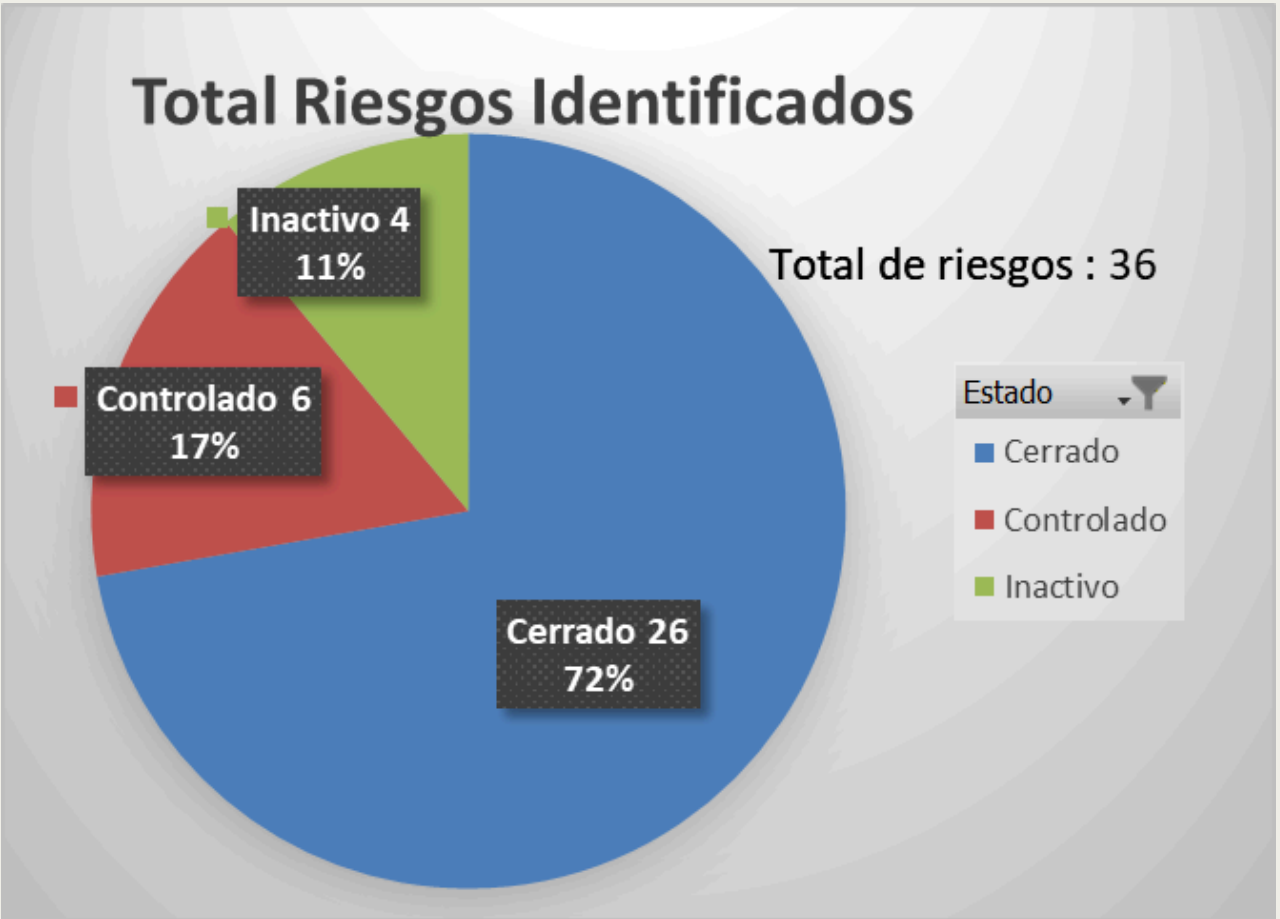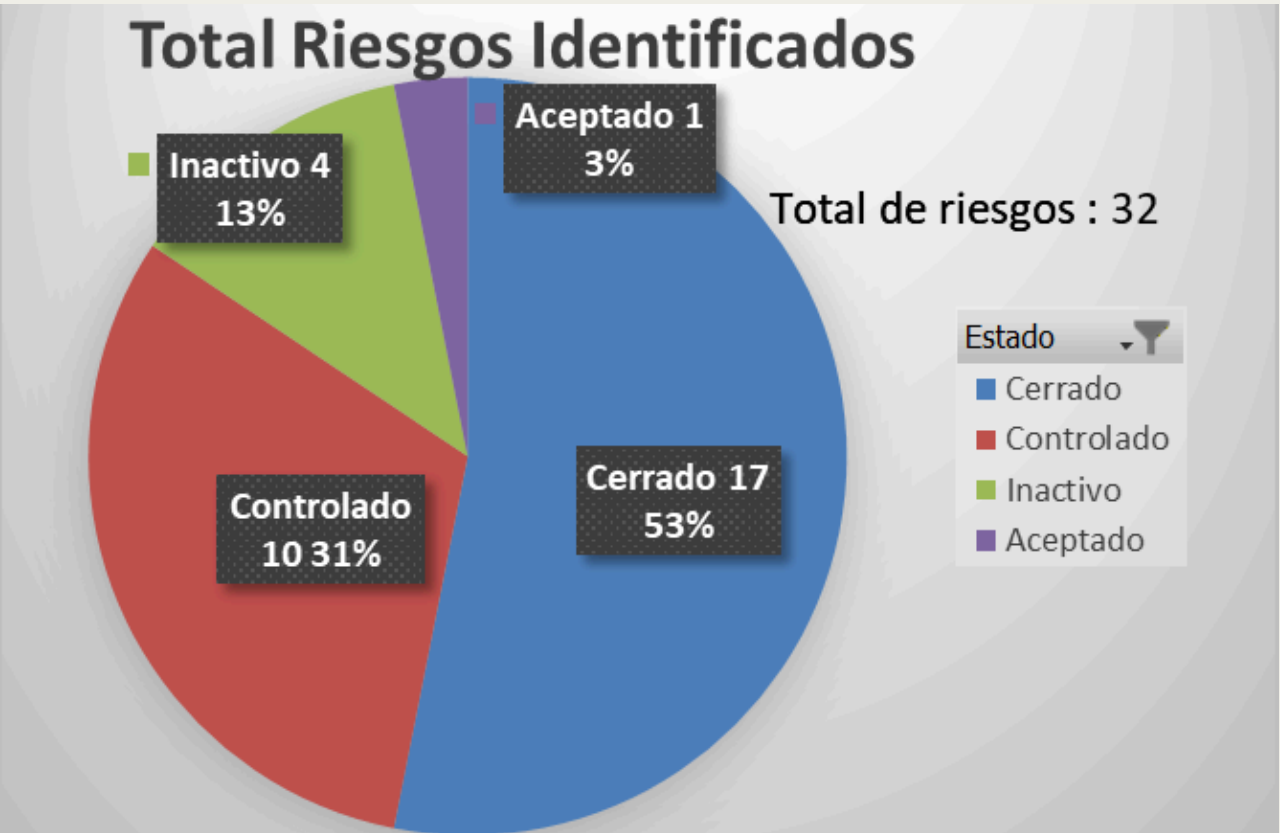

COMPROMISOS TOMADOS

SPRINT 4 SEMANA 3



<input type="checkbox"/>	Actividad	Prioridad	Estado	Start date	Fecha de ven... ↑	Persona asignada	Informador
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-19 04- Pruebas y ajustes	Medium	FINALIZADO	11 nov 2025	12 nov 2025	fernanda barra	DYLAND ANTO...
<input type="checkbox"/>	> <input checked="" type="checkbox"/> MFT-87 Corrección de errores	Medium	CURSO	30 oct 2025	21 nov 2025	DYLAND ANTONIO A...	DYLAND ANTO...
<input type="checkbox"/>	▼ <input checked="" type="checkbox"/> MFT-24 QA y Ajustes	Medium	CURSO	20 oct 2025	21 nov 2025	Polet Andrea Adasme...	DYLAND ANTO...
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-27 01-Diseño plan de pruebas MOBILE	Medium	FINALIZADO	20 oct 2025	21 oct 2025	Polet Andrea Adasme...	DYLAND ANTO...
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-28 02- Pruebas Funcionales MOBILE	Medium	FINALIZADO	22 oct 2025	29 oct 2025	Polet Andrea Adasme...	DYLAND ANTO...
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-83 05- Plan de pruebas WEB	Medium	FINALIZADO	03 nov 2025	04 nov 2025	DYLAND ANTONIO A...	DYLAND ANTO...
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-84 06-Casos de pruebas funcionales WEB	Medium	FINALIZADO	05 nov 2025	12 nov 2025	DYLAND ANTONIO A...	DYLAND ANTO...
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-29 03- Pruebas de Integración MOBILE	Medium	FINALIZADO	29 oct 2025	16 nov 2025	Polet Andrea Adasme...	DYLAND ANTO...
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-85 07-casos de integracion web	Medium	CURSO	13 nov 2025	19 nov 2025	DYLAND ANTONIO A...	DYLAND ANTO...
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-32 10- Validación Final MVP	Medium	CURSO	20 nov 2025	21 nov 2025	DYLAND ANTONIO A...	DYLAND ANTO...
<input type="checkbox"/>	> <input checked="" type="checkbox"/> MFT-50 Actualizacion y cambios dentro del proyecto	Medium	CURSO	13 sept 2025	22 nov 2025	DYLAND ANTONIO A...	DYLAND ANTO...
<input type="checkbox"/>	▼ <input checked="" type="checkbox"/> MFT-25 Entrega	Medium	NO INICIADO	17 nov 2025	22 nov 2025	DYLAND ANTONIO A...	DYLAND ANTO...
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-80 Validacion de usuarios	Medium	NO INICIADO	17 nov 2025	22 nov 2025	DYLAND ANTONIO A...	DYLAND ANTO...
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MFT-89 Entrega de documentacion actualiz...	Medium	NO INICIADO	17 nov 2025	22 nov 2025	DYLAND ANTONIO A...	DYLAND ANTO...

PROYECTO MINIFIT

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Jira-MiniFit

